



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201403BC145

夕歌

样品名称: 聚苯板 Sample Name

受检单位: 北京百圣群工贸有限公司

Client

检验类别:______抽样检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201403BC145

第1页共3页

1NO.): 201403BC145	HOYAN	第1页共3页			
聚苯板。	检验类别	抽样检验			
北京百圣群工贸有限公司	生产日期	2013年12月20日			
北京百圣群工贸有限公司	规格型号	江東古古古			
公司仓库	商标	胡姐妈			
邓杰 陈嘉宇	等级	B _I (C)级			
2014年03月07日	抽样数量	20块			
完整、无缺损样块	抽样基数	2000m ²			
建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心					
GB/T 10801.1-2002《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料》 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》					
1. 燃烧性能等级 2. 氧指数 3. 压缩强度 4. 吸水率 5. 水蒸气透过系数 6. 导热系数 7. 尺寸稳定性 8. 外观 9. 表观密度 10. 熔结性(断裂弯曲负荷)					
8624-2012 中平板状建筑材料及制品度、吸水率、水蒸气透过系数、导热	B ₁ (C)級的 系数、尺寸稳定	技术指标要求;压缩强 2性、外观、表观密度、			
	聚苯板 北京百圣群工贸有限公司 北京百圣群工贸有限公司 公司仓库 邓杰 陈嘉宇 2014年03月07日 完整、无缺损样块 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督 GB/T 10801.1-2002《绝热用模塑聚苯GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧 1. 燃烧性能等级 2. 氧指数 3. 居 5. 水蒸气透过系数 6. 导热系数 9. 表观密度 10. 熔结性(断裂弯曲 *经检验,抽检样品的燃烧性能等 8624-2012 中平板状建筑材料及制品度、吸水率、水蒸气透过系数、导热 熔结性(断裂弯曲负荷)的检验结果符	聚苯板 检验类别 北京百圣群工贸有限公司 生产日期 北京百圣群工贸有限公司 规格型号 公司仓库 商 标 邓杰 陈嘉宇			

备注: (此处空白)

批准:

量 审核: 344

编制:

THE .

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201403BC145

第2页共3页

序号	检验	〕 项目	标准要求 (I型)	检验结果	单项结论
1885 1885 1885 1885 1885 1885 1885 1885	燃烧性能 等级 B ₁ (C)级	燃烧增长 速率指数/ (W/s)	≤250	233	合格
		火焰横向 蔓延	未到达试样长翼边 缘	未到达试样长翼 边缘	符合
		600s 的总 放热量/MJ	<15		合格
		60s 内焰尖 高度/mm	<150, 无燃烧滴落 物引燃滤纸现象	137, 无燃烧滴落 物引燃滤纸现象	合格
2	氧指数/%		>30	32	合格
3	压缩强度/kPa		>60	32114223	合格
4	吸水率(体积分数)/%		\$35 < 67 53	2.5	合格
5	水蒸气透过系数 /[ng/(m·s·Pa)]		≤6	3.0	合格
6	导热系数 (25.00℃)/[W/(m·K)]		<0.041	0.039 (平均温度: 25.00℃)	合格
3	尺寸稳定性 (70℃±2℃下, 48h)/%			0.2	合格
8	外观		色泽均匀,表面平 整,溶结良好,无明 显油渍和杂质	色泽均匀,表面平整,溶结良好,无明显油渍和杂质	符合

备注: 透湿系数: 采用干燥剂法, 试样厚度 25mm, 温度 22℃, 湿度 55%。

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告


TEST REPORT

中心编号(No.): 201403BC145

第3页共3页

序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项结论
9	表观密度/(kg/m³)	>15.0	18.3	合格
10	熔结性(断裂弯曲负荷)/N	>15	26	合格

(样品照片)

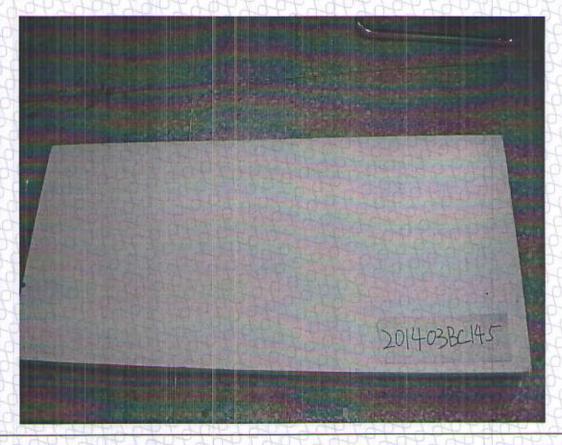

备注: 燃烧性能等级: 本试验结果只与制品的试样在特定试样条件下的性能相关,不能作为评价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。
